



## Hovedstyremøte Mandag 07.11.2015

Innkalte er: Øyvind Moe, Ole Herman Fjelltn, Alexander M Popov Morten Svendsen, Per Olav Håre, Kolbjørn Walderhaug, Kai Lyche, Gunnar Støltun, Stig Harald Hovind, Ingar Brenna

Oppmøte: Morten Svendsen, Ole Herman Fjelltn, Per Olav Håre, Øyvind Moe, Ingar Brenna, Stig H. Hovind, Kolbjørn Walderhaug, Alexander M Popov

### Referat, fra 6. oktober 2015

Ingen kommentarer

### Status nytt klubbhus

Ingar lurte på bakgrunnen for eposter fra Øyvind den siste tiden.

Øyvind vil ikke svare på dette og mener gjennomgangen og annet må følge sakliste.

Morten lurte på samme spørsmålet med kommentar rundt problemet at Ingar må forlate møtet, noe han ikke burde når den saken blir tatt opp. Øyvind vil ikke svare på noe rundt dette og sier om det må tas opp, så blir møtet avsluttet.

Ingar starter gjennomgang av den forberedte presentasjonen (vedlagt). Kun ekstra kommentarer blir referert her.

Kommentar: Fjelpumpe er kanskje ikke jodet. Elektriker sjekker opp og fikser om nødvendig. Denne kosten er ikke en del av byggeprosjektet.

Graving for trekking av strøm til byggelokalet og fjelpumpe tas på byggeprosjektet – dette var ikke i opprinnelig plan men ble godkjent av styret.

Frakopling og plombering av gammelt VA må også gjøres, ukjent om det var med i opprinnelig plan, men må gjøres. Endelig kostnad kommuniseres pr mail, men enstemmig at det må gjøres er kostnaden under kr 20 000, så kjører byggekomitéen videre med bare informasjon til styret.

LN-GHC forventes levert i januar/februar 2016.

For utestående saker som må tas (liste i vedlegg), foreslås det at det oppnevnes en fra hver gruppe som kan ta tak i dette. Flyplassjef må være med på dette. Byggekomitéen stiller som rådgivere ved behov.

Ønske om en åpen dag for medlemmer så fort vi får overtatt huset.

Ingar avslutter presentasjonen og de tilbakemeldinger som ble gitt var utelukkende positive. Ingen forespørsler om ytterlige detaljer ble gitt.

Morten informerte at elektriker har blitt kontaktet av Gunnar Støltun som har krevd å få vite endringer som er gjort. Elektriker prøvde å henvise til byggekomitéen, men det ble avvist og informasjon krevd. Dette er ikke akseptabelt og det vises til tidligere vedtak om hvem som har lov til å ta kontakt med leverandør. Dette er et klart brudd på det vedtaket.



### **Prosjekt klubbhåndbok**

Arbeidet fortsetter og Stig legger fram når første utkast er klar for gjennomlesning.

### **Økonomi - Inntektsgjennomgang for 2016 (priser, osv)**

Litt dårlig likviditet etter at fakturaer til bygging er betalt ut fra driften. Øyvind opplyser at forventede innbetalinger de nærmeste dagene vill løse dette (bingo ol.)

Vedtatt å samle alle tildelinger samt felles utgifter/lån mot en regnskapspost som er felles, ikke fordelt på gruppene som før. Dette både siden vi nå har felles lån på klubbhus, samt et forsøk for å få regnskapet mer oversiktlig.

Nytt HC seilfly, skal det eies av DFK felles eller av seil? Drift av flyet er av seil. Dette må vurderes av gruppestyrene før avgjørelse i hovedstyret.

Årskort/abonnement belastes flykonto i januar, selv om hele beløpet belastes. Da kan betaling fordeles med autotrekk pr måned, dette er opp til hvert medlem og må opplyses om i gruppene.

Grundig diskusjon rundt priser. Alexander foreslår at ingen store endringer skal utføres av hovedstyret nå da det er mye uro i klubben og det kan skape mer uro. Gruppene kan om nødvendig for gruppeøkonomi gjøre endringer.

Konklusjonen ble at det må begynnes en gjennomgang nå som nyvalgt styre etter årsmøtet må fortsette og fatte endelig vedtak. Under følger kommentarer av diskusjon som ble påbegynt.

Gruppene skal internt ta opp dette med årskortpriser for å se om man kan komme til samme pris.

Mulighet å redusere timeprisene for kompensere for økt årskortpris?

Anbefaling om å gå igjennom budsjett for alle fly. Øyvind ber Alexander dele modellen brukt for Dynamic kjøpet.

Landingsavgift forblir som det er. Det er så få som kommer på besøk at det utgjør ikke noen forskjell.

Priser for hangartomt leie, stasjonering og parkeringsavgift for seilflyhengere ble diskutert. Det ble besluttet at dette ikke gjøres noe med nå som nevnt over, men en henstilling til neste styre om å revidere dette.

### **Operasjoner mikroflygruppa**

Bra aktivitet flyet går videre.

Funker Flarm? Dette må sjekkes/fikses.



## Operasjoner motorgruppa

DFM har gått greit i høst, men har gått litt lite.

Timer på DFL er ikke kjent, men det har dessverre kommet noen større utgifter der i år.

## Operasjoner seilflygruppa

Jobber med tallene, men alt tyder på at det er bedre i år enn i fjor.

En-setere har gått bedre i år enn før, trolig siden de har stått montert.

Forbereder salg av en ASK-21, men selger ikke om prisen ikke er riktig.

LN-GID, avtalen er sagt opp og fakturaer som kommer fremover skal videresendes og ikke betales av DFK.

## Hangarer, bygninger, oppstillingsplass, flystripe og Fuelanlegg

Nytt brøytemannskap. Kun til orientering da dette ble avgjort pr mail før møtet.

Tre felling utføres av e-verket når det er frost i bakken, der må det dugnad for å rydde etterpå.

Campingvogn ble bedt flyttet, nå er den flyttet til nabotomt. Hovedstyret mener at den må flyttes av hensyn til grunneier. Den kan ikke stå der og benyttes i forbindelse med klubben. Ingen strøm skal gis. Flyplassjef tar dette videre med fullmakt fra hovedstyret.

Seilflyhangar må fikses på, det må bygges opp under taket for å forhindre ansamling av snø/is/vann. Seilflygruppa tar dette videre med fullmakt til å gjøre det som må. Kun informasjon til hovedstyret er nødvendig angående dette.

## Flytekniske operasjoner

Sikkerhetsmøte for alle medlemmer, gruppen tar og setter opp punkter for et slikt møte med fokus for operasjonen på HS. Alexander foreslår et annet navn en sikkerhetsmøte siden Mikro allerede har et årlig pålagt sikkerhetsmøte med samme tittel. Forslag om å invitere Tore Hultgren som foreleser.

## Naboforhold og kommune

Øyvind har bedt om et nytt møte med naboene og kommune.

Per Olav mener at det må komme nye inn som representanter fra klubben. Det er for mye historikk som ikke er bra. Det kan være sunt med tanke på ny konsesjonsrunde å starte på nytt. Ole Herman kan være med, men det trengs en person til. Øyvind foreslår at Ole Herman tar styringen på det neste nabo møte, mens Øyvind forholder seg litt mer i bakgrunnen, da får naboene et nytt ansikt samtidig som Øyvind sikrer kontinuitet i det som har blitt sagt/gjort tidligere.

Loggføring via ADSB/Flarm skal tas opp på årsmøte for å ta en avgjørelse om det kan settes i produksjon. Det er pr i dag kun under utvikling, uten godkjennelse fra årsmøtet kan data ikke brukes til noe.



## **Miljøskapende forhold, PR, Media og HC**

Utgikk fra dagens agenda

### **Andre saker**

Konsesjonssøknad

Øyvind foreslår å lage et forslag til konsesjonssøknad. Den sendes rundt til hovedstyret slik at den er klar for endelig godkjenning av nytt styre etter årsmøtet. Ingen ting blir sendt fra klubben før nytt styre er på plass og kan signere søknaden, dette sees på som mer ryddig siden det er det nye styret etter februar som skal håndtere søknaden videre.

Årsmøte dato: 18 februar 2016. Det skal gå utenom vinterferier.

Neste hovedstyremøte blir tirsdag 26 Januar.

John Eirik Laupsa har tilbudt DFK å ta over opsjon på ASK-21 for det nye HC flyet for redusert pris. Det blir bedt at Laupsa sender bekreftelse til Øyvind Moe (i rollen som leverandør) som igjen tar det med fabrikken for å få det på plass.

Møtet hevet klokken 23:40

Det var stor enighet om at det hadde vært et bra og konstruktivt møte, dog litt langt.

# 2015/RB4913 «DFK's Universelt Utformet Klubbhus»



- Status Fremdrift og Prosjektreghnskap – Hovedstyremøte Drammen Flyklubb
- 7. desember 2015



# 2015/RB4913 «DFK's Universelt Utformet Klubbhus»



- Bakgrunnen for prosjektet
- Målsetting for prosjektet
- Framdriftsplan
- Framdriftsrapport
  - Aktiviteter i prosjektet etter framdriftsrapporten i august
  - Status gjenstående arbeider.
  - Status nytt HC tilpasset seilfly – LN-GHC
  - Sakar fra Byggekomiteén til orientering & behandling på hovedstyremøtet
- Budsjett vedtatt på årsmøtet
- Status prosjektregnskapet
- Endringsavtaler – nye...





# Bakgrunnen for prosjektet

- Nedslitte arbeidsbrakke som fungerer som klubbhus i dag
  - Ekskluderer personer med nedsatt funksjonsevne.
- Et nytt universelt utformet klubbhus
  - Universelt utformet løsning som inkluderer rullestolbrukere som fullverdige medlemmer, som kan delta i klubbens aktiviteter som andre.
  - Undervisningsrom for teori
  - «Hangarprat» i stua
  - Sanitærrum m/dusj og Toalett
  - Kiosk, Kjøkken, Arkivrom, 1 – 2 Soverom
- Et inkluderende klubbhus med gode, funksjonelle og brukervennlige løsninger for alle.







## MANDAT BYGGEKOMITÉ – PROSJEKT ”NYTT KLUBBHUS”, FASE 2

### Oppgave

- Videreføre arbeid med ferdigstilling av nytt klubbhus:
  - Følge prosjektplanen
  - Følge opp teknisk løsning og delta på byggemøter
  - Betale påløpte, godkjente fakturaer fra byggentreprenør
- Føre prosjektrekskap (eventuelt i samarbeid med kasserer)
- Samarbeid med Extrastiftelsen
  - PR og mediarbeid
  - Rapportere til Extrastiftelsen om prosjektfremdrift
  - Søke Extrastiftelsen for termin to og tre av utbetalingene innen tidsfristen
- Forestå koordinering av egeninnsats
- Bestille HC-utrustet seilfly i tråd med godkjent plan.
- Planlegge utarbeiding av HC-tilbud i samarbeid med seilflygruppestyret.
- Utrede ytterligere pengestøttemuligheter og søke om disse

### Forutsetninger

Disponering av midler ut over det som ligger i planen må godkjennes i hvert enkelt tilfelle av hovedstyret.

Byggekomiteén arbeider selvstendig men må informere hovedstyret om fremdrift samt godkjenning fra hovedstyre før søknader sendes offentlige myndigheter.

Byggekomiteén må ikke forplikte Drammen Flyklubb uten forutgående godkjenning av hovedstyret i hvert enkelt tilfelle.

### Tidsramme

Prosjektets tidsramme vil være til alle tildelte midler fra Extrastiftelsen er oversendt Drammen Flyklubb og disponert i tråd med planen.

Prosjektet vil med dette starte med oppføring av nytt klubbhus og gradvis flytte fokus på HC-tilbud.








# Målsetting for prosjektet

- Finansiere og bygge nytt funksjonelt og universelt utformet klubbhus
- Finansiere anskaffelsen av spesialutstyrt seilfly for rullestolbrukere
- Inkludere fysisk funksjonshemmede og vanskeligstilt ungdom i både den teoretiske utdannelsesfasen og praktisk flygingen



# Fremdriftsplan – Nytt universelt utformet klubbhus

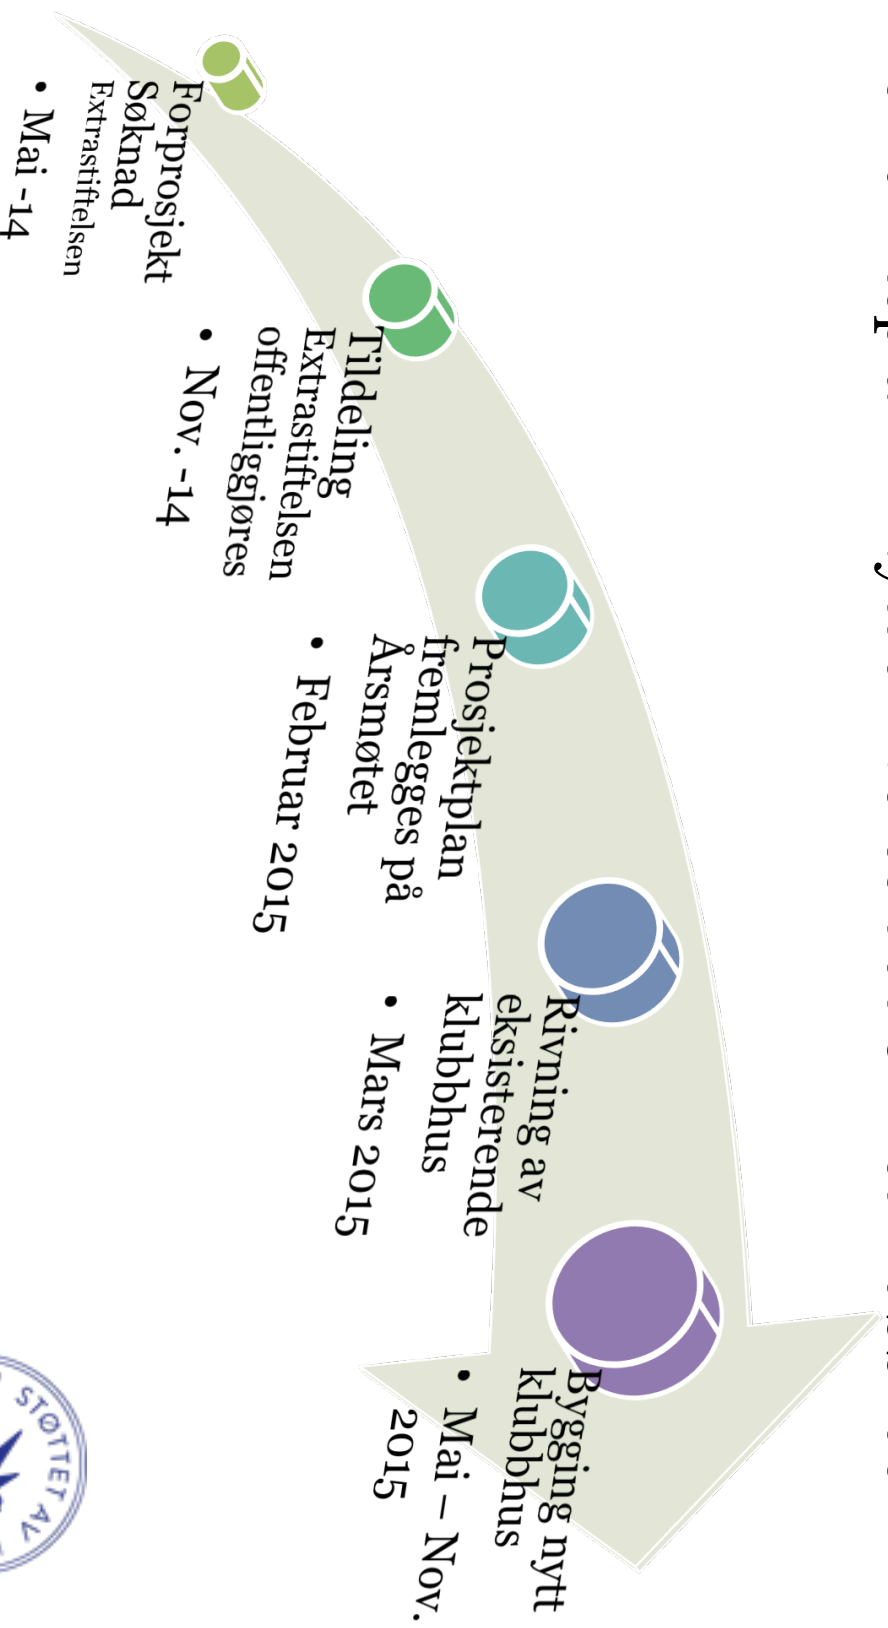



# Frandriftsrapport – Aktiviteter i prosjektet etter august

Bygging og innredning av det nye universelt utformede klubbhuset, går etter avtalt fremdriftplan.

## Detaljert status i de forskjellige fagene Uke 49 – 2015

- Snekkerne blir ferdige med sine utvendige og innvendige arbeider neste uke.
- Flislegger er ferdig med alt flisarbeid inne og ute.
- Rørlegger har noe gjenstående arbeider. Ferdigstillelse i uke 50, med tilkobling av V/A.
- Elektriker har noe gjenstående arbeider og arbeidet er planlagt ferdigstilt i løpet av uke 50. Strømmen ble tilkoblet torsdag 3. des. og det ble lys i klubbhuset...





# Framdriftsrapport – Aktiviteter i prosjektet etter august

## Status dugnad

- Legging av innvendig gulv ferdig uke 47
- Kjøkken er ferdig montert med noe gjenstående avklaringer vedr utlufing fra kjøkkenventilator. Sokkel listen må også tilpasses og monteres.
- Terrasse er 90 % ferdig. Mange har deltatt på dugnaden og mange har frosset seg gule og blå...
- Bort kjøring av søppel til Mile Gjenvinningsstasjon er ajour og de forskjellige gruppene har stilt opp hver helg. Det er fortsatt søppel å kjøre bort etter at håndverkerne fortløpende ferdigstiller sine arbeider.





# Framdriftsrapport – Status gjenstående arbeider

## Diverse

- Plate til varmepumpe (utedel) blir støpt og varmepumpe blir montert i uke 50/51
- Har gjennomført befarings med låsesmed og vi får tilbud på en anbefalt løsning på lås, kameraovervåking & alarm tilpasset klubbhus.
- Har avsluttet leie av mobilt toalett fra Utleie Partner og de har hentet toalettet.

## Gjenstående kostnader (hovedpunkter)

- Gjenstående av kontrakt Hellvik Hus (Gjenstår **kr. 243 142,-** av kontrakt)
- Lås & innbuddsalarm (overslag **Kr. 20 000,-**)
- Endringsavtale 4. Endringer ifb pumpekum VA (**Kr. 118 500,-**)
- Endringsavtale 9. Flislegging av trapp ute (**Kr. 6 470,-**)
- Oppvaskmaskin er ikke kjøpt. (**Kr. 4 000,-**)





# Framdriftsrapport – Status nytt HC tilpasset seilfly – LN-GHC

## Innkjøp av nytt HC tilpasset seilfly – LN-GHC

- Presentasjon av kostnadene for det komplette HC utstyrte seilflyet, LN-GHC ble presentert for hovedstyret 21. oktober
- Instrumenter og utstyr ble bestilt av Alexander Schleicher 24. oktober
- ICAO kode til transponder ble sendt Alexander Schleicher 3. november
- I juni fikk vi skriftlig bekreftet levering i januar/februar 2016. Etter juni har vi ikke mottatt endringer i forventet leveringsdato.







## Frاندriftsrapport – Saker fra Byggekomitéen til orientering & behandling

- Vi har mottatt fakturaer fra Hellvik Hus, Maxbo og Carlsen Fritzøe, samt utlegg for kjøp av hvitevarer. Alle disse fakturaene har forfalt til betaling.
- Alle arbeider i klubbhuset er planlagt ferdigstilt i uke 51. Dato for overlevering er ikke avtalt med Hellvik Hus ennå. Dette kommer vi tilbake til så snart datoen er fastsatt.
- Tidligere denne uke kom bekreftelsen fra ExtraStiftelsen på at vi har blitt tildelt midler for år 2. (800.000,-)
- DFK har sendt søknad om utstyrmidler til HC system ( 28.440,- til ror og pedaler for funksjonshemmede) i for og bakeset i nytt seilfly ASK-21 LN-GHC.





# Frاندriftsrapport – Saker fra Byggekomitéen til orientering & behandling

**Nå er det kun uker igjen til vi ta i bruk vårt nye flotte klubbhus, men foreløpig er det bare et tomt skall...**

- Har hovedstyret satt av midler til innkjøp av møbler og utstyr, og/eller satt ned en gruppe til å arbeide med dette? (Ligger utenfor mandatet og budsjettet til Byggekomitéen)
- Et nytt klubbhus trenger noen til å følge opp og på en måte være en «vaktmester», som sørger for at alt er på stell. Er denne oppgaven fordelt? (Tidligere har flyplassjefen hatt denne oppgaven)
- Klubbhus regler er også påkrevet. Vi er 3 grupper som skal «leve og trives i sammen» og da er det veldig greit å ha klubbhusregler utarbeidet av alle gruppene i fellesskap.
- Klubbhus trenger også renhold. Er dette noe hovedstyret ser for seg som dugnadsarbeid eller ønsker man å sette bort dette arbeidet til en avtalt pris?
- Vi har fått «bekreftet» at det blir store kostnader ved etablering av fibernett tilknytning. Har hovedstyret drøftet hvilke løsning man ønsker å gå for? (Ice.net 4G / Telenor 4G...)
- RiksTV eller Canal Digital? Skal vi kjøpe inn TV nå eller vente...?
- Det er snart tid for DFK's tradisjonsrike julebord avslutning på sesongen og nå har vi mulighet for å slå dette sammen med innvielsesfest av det nye klubbhuset. Er dette noe hovedstyret (eller en nedsatt gruppe) er i gang med å planlegge?



# Budsjett – vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015

<u>Tildelte midler</u>			
•	Extrastiftelsen 2015	800 000	Klubbhus
•	Extrastiftelsen 2016	800 000	Ask 21
•	Extrastiftelsen 2017	800 000	Klubbhus
•	<b>Sum</b>	<b>2 400 000</b>	
<u>Prosjekt</u>			
•	Klubbhus	3 100 000	
•	vann og kloakk	320 000	
•	Ask 21	1 200 000	
•	<b>Sum</b>	<b>4 620 000</b>	
•	<b>Lån:</b>	<b>2000 000</b>	<b>(økt til 3 000 000 på Ekstraordinært Årsmøte 18. juni 2015)</b>
•	Søkt fra Berg-stiftelsen 2014	400 000	
•	Hvorav	100 000 til skoling	
•		300 000 til nedbetaling av gjeld	
•	I tillegg blir det søkt om midler fra Øvre Eiker Idrettsråd fra 2015		





# Prosjektregnskap ny ASK-21 m/HC utstyr

<u>Post</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Budsjett</u>
Budsjett ny ASK-21 m/HC utstyr		1 200 000
Depositum ASK 21 (12.000,- €)	105 561	
Faktura Alexander Schleicher (96.780,- €)		
Basic HC utstyrt ASK-21 (fratrekk for depositum)	787 844	
Instrumenter & utstyr LN-GHC (30.408,- €)	280 705	
Frakt, toll og registreringskostnader		
Sum kostnader 2015- 2016	1 174 110	1 200 000





# Prosjektregnskap – Effekt av egeninnsats

(utover utvendig maling og bortkjøring søppel)

<u>Dato</u>	<u>Post</u>	<u>Kostnad</u>	<u>Besparelse</u>
<b>Endringsavtale 5 - Diverse fratrekk egeninnsats</b>			
04.12.2015	herunder laminatgulv, treplating, kjøkken m. mer		-288 780
18.11.2015	Aubo kjøkken	41 200	
04.12.2015	Hvitvarer kjøkken (komfyr, kombiskap, oppvaskm.)	9 980	
04.12.2015	Materialer treplating & laminatgulv	30 551	
<b>Endringsavtale 6 - Forlengelse kjøkkenvegg og ekstra vegg mellom kjøkken og teknisk, dør til teknisk rom, og fratrekk for 20m2 brystning</b>			
04.12.2015	<b>Endringsavtale 7</b> - Huntonit smartpanel på vegg	19 979	
<b>Endringsavtale 8 - Diverse endringer/reduksjon på elektriske installasjoner, etter anbefaling fra Olaf</b>			
04.12.2015	Helge Ask AS		-26 606
31.12.2015	Sum kostnader 2015	101 710	-315 386
<b>Effekt endringer &amp; egeninnsats</b>			<b>-213 676</b>



# Prosjektregnskap – Klubbhuset



Dato	Bilag nr.	Post	Kostnad	Budsjett
01.01.2015		Budsjett kostnader 2015		3 100 000
01.01.2015		Budsjett Vann og kloakk		320 000
27.02.2015	1	Faktura 1 - 2 % av kontraktssum 2.962.478	48 629	
07.05.2015	2	Byggesaksgebyr Øvre Eiker kommune	17 180	
08.05.2015	3	Faktura 2 - riving av eksisterende klubbhus	265 000	
08.05.2015	3	Faktura 3 - arbeider i grunnen	266 044	
08.05.2015	3	Endringsavtale 1 - boring VA	322 250	
03.07.2015	4	Faktura 4 - 40 % av kontrakt	972 574	
03.07.2015	4	Endringsavtale 2 - Diverse endringer bygg	35 191	
16.10.2015	5	Faktura 5 - 20 % av kontrakt	486 287	
16.10.2015	5	Endringsavtale 3 - tillegg ifm byggestopp	18 188	
16.10.2015	6	Monter - Aubo kjøkken	41 200	
04.12.2015	7	Tilknytnings gebyr avløp - Øvre Eiker kommune	8 775	
04.12.2015	8	VA tilknytningsavgift Øvre Eiker Prestegård	11 047	
04.12.2015	9	MAXBO - Terrasse materialer	1 112	
04.12.2015	10	Faktura 6 - 28 % av kontrakt	680 802	
04.12.2015	10	Endringsavtale 5 - Diverse fratrekk egeninnsats	-288 780	
04.12.2015	10	Endringsavtale 6 - Forlengelse kjøkkenvegg	0	
04.12.2015	10	Endringsavtale 7 - Huntontit smartpanel på vegg	19 979	
04.12.2015	10	Indeks iht kontrakt	15 573	
04.12.2015	10	Endringsavtale 8 - Kreditnota 179	-26 606	
07.12.2015	11	Carsen Fritzøe - Terrassebord	2 280	
		Maling og maleutstyr	9 665	
		Carsen Fritzøe - Materialer plattning og laminatgulv	27 159	
		Komfyr & kjøleskap	5 980	
		Leie toalett	13 000	
		Oppvaskmaskin (Tilbud Expert)	4 000	
		Prosjektør & læret	6 000	
		Lås & innbuddsalarm	20 000	
		Endringsavtale 4	118 500	
		Endringsavtale 9	6 470	
		Faktura 7	243 142	
31.12.2015		<b>Sum kostnader / budsjett 2015</b>	<b>3 350 641</b>	<b>3 420 000</b>
		<b>Gjenstående diverse utgang 2015</b>		<b>69 359</b>





# Endringsavtaler - Endringsavtale 4



## ENDRINGSAVTALE

Brevdato: 28

Drammen Fylke  
Postboks 1528  
3007 Drammen

KROKSTADELVA, 14. april

## ENDRINGSAVTALE NR 1

I forbindelse med avtale om endringer i arbeidet på Dires bolig (gnr. 18 bnr. 1 festst. 0624 Øvre Eiker kommune fremsatt 14. april 2015 jf. bustadoppføringslova § 9, gjøres i samsvare med Bustadoppføringslova § 42, 3. ledd, følgende endringer i kontrakten:

nr	Trakt	Tillegg	Fratrekk
1	Boring 194 meter inkl pumpekum og stoppetran	289 500	
2	Graving 11m 194 meter boring	32 750	
3			
4			
5			
Sum inkl. mva		322 250	
Sum tillegg/fradrag overføres Finansieringsinstitusjon (+ -) inkl. mva			+322 250,-

Forbrukeren er ansvarlig for å akklare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon. Endringsarbeidet forfaller til betaling når arbeidet er fullført.

UNDESKRIBT FORBRUKER  
Inn 4/14-2015  
Overstilt  
Haugstvedt  
Drammen Fylke

UNDESKRIBT ENTREPRENØR  
Inn 14. april 2015  
Overstilt  
KROKSTADELVA  
Abrahamsson & Haugstvedt AS

Drammen-28-01-Endringsavtale-1x Utarbeidet 12.10.06

Side 1 av 1

Sist rev

## ENDRINGSAVTALE

Brevdato: 28-016

Drammen Fylke  
Postboks 1528  
3007 Drammen

KROKSTADELVA, 6. august -  
2015/rev. 11.11.2015

## ENDRINGSAVTALE NR 4 - endringer i/b pumpekum og arbeider i grunn

I forbindelse med avtale om endringer i arbeidet på Dires bolig (gnr. 18 bnr. 1 festst. i 0624 Øvre Eiker kommune fremsatt 6. august 2015 jf. bustadoppføringslova § 9, gjøres i samsvare med Bustadoppføringslova § 42, 3. ledd, følgende endringer i kontrakten:

nr	Trakt	Tillegg	Fratrekk
1	Tillegg fra graveentreprenør:		
1	Termining og fylling av eksisterende avløpskum	13 750	
2	Tillegg fra graveentreprenør:		
2	Asfaltering ved pumpestasjon	29 253	
3	Tillegg fra rørlegger:		
3	Reiseid i/b med styrt boring	4 538	
5	Tillegg fra rørlegger:		
5	Drenerende sluk rundt pumpekum	9 481	
6	Tillegg fra graveentreprenør:		
6	Tillegg for gravning av grunn fra mottaksgrupp forbi pumpekum	74 653	
7	Fratrekk fra rørlegger:		
7	Fratrekk for redulisjon av antall 1m boring 13 m a' 445,-		-5 785
8	Fratrekk for fiberkabel (i forbindelse med styrt boring)		
8	194m a'55,-	12 610	
9	Goodwill, Heivik Hus Drammen, Abrahamsson & Haugstvedt dekker merkostnad på styrt boring i henhold til mail datert 9.29.01.15		-20 000
Sum inkl. mva		144 285	-25 785
Sum tillegg/fradrag (+ -) inkl. mva			+118 500,-

Forbrukeren er ansvarlig for å akklare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon. Endringsarbeidet forfaller til betaling når arbeidet er fullført.

Endringsavtale 4x Utarbeidet 12.10.06

Sist revidert

Side 1 av 2



# Endringsavtaler - Endringsavtale 9



## ENDRINGSAVTALE

Beskrivelse: **28-016**

Drammen Flyklubb  
Postboks 1528  
3007 Drammen

Abrahamsson & Haugstvedt AS  
Gamle Riksvei 235, 3055 KROKSTADELVA  
NO 98343847 MVA  
Faks:  
Tlf. +47 32237470

KROKSTADELVA, 01. desember  
2015

## ENDRINGSAVTALE NR 9

I forbindelse med avtale om endringer i arbeidet på Deres bolig (gnr. 18 bnr. 1 lestein. i 0624 Øvre Eiker kommune framsatt 11. november 2015 jf. bustadopføringslovas § 9, gjøres i samsvar med Bustadopføringslovas § 42, 3. ledd, følgende endringer i kontraktene:

Pos	Teke	Tillegg	Endring
1	Fratrekk for fresing av spor i ytterder for mikrobryter. 1 (itt avtale med Morten Svendsen av teldn 10.11.15)		-2 200
2	Tillegg for fliser og legging av fliser på plattform utvendig 2 inngangsparti	8 670	
3			
4			
5			
Sum inkl. mva		8 670	-2 200
Sum tillegg/fradrag inkl. mva			+6 470,-

Forbrukeren er ansvarlig for å avklare endringsavtalen med sin finansieringsinstitusjon.

Endringsarbeidet forfaller til betaling når arbeidet er fullført.

UNDERSKRIFT FORBRUKER		UNDERSKRIFT ENTREPRENØR	
Løst	Sist	Tidsp	Sist
Underskrift		Underskrift	
Drammen Flyklubb		Abrahamsson & Haugstvedt AS	

